EDITORIAL / DECISION BRIEF



概念配图 · 非业务事实证据

建议有条件
批准小范围试点

【建议】领导决策汇报 · 15 分钟建议讲述 · 待拍板，非已批准

来源、字段口径与讲稿见随附证据包 · 待人工复核

本次请求：批准试点边界，不背书全面推广

【建议】待决策；责任、资源与启动条件仍需确认。



AI 生成概念雕塑 · 非产品、非业务证据

建议授权，不代表试点已启动或领导已批准。

仅使用有授权、可追溯的材料，先产出草稿

指定业务复核人与技术负责人；人选待确认

关键问题、授权或成本不清时暂停，不直接发布

范围、资源上限及退出条件批准后才启动

来源、字段口径与讲稿见随附证据包 · 待人工复核

已有工程证据，但不是商业质量认证

【事实】仅限所列源码与历史测试范围；不等于商业验收。

240

技能用例通过数

上一轮技能后端回归

25

界面用例通过数

上一轮相关界面回归

4

扩展 API 失败项

HEAD 对照同样复现

可以交付可编辑草稿，不能承诺商业成稿

【事实】仅限所列源码与历史测试范围；不等于商业验收。

已实现的工程能力

授权材料规划与来源引用

原生文字、图表、表格及讲稿

实际 PDF 与全页渲染证据

规划恢复与独立质量报告

不能据此承诺的效果

独立事实核查与商业视觉批准


真实商业材料与真实模型已验收

任意旧 PPT 无损编辑

会话修订、版本对比与目标 Office 认证

扩展 API 仍有失败，需先判断试点影响

【事实】同一批扩展 API 检查； HEAD 对照复现，不等于自动放行。

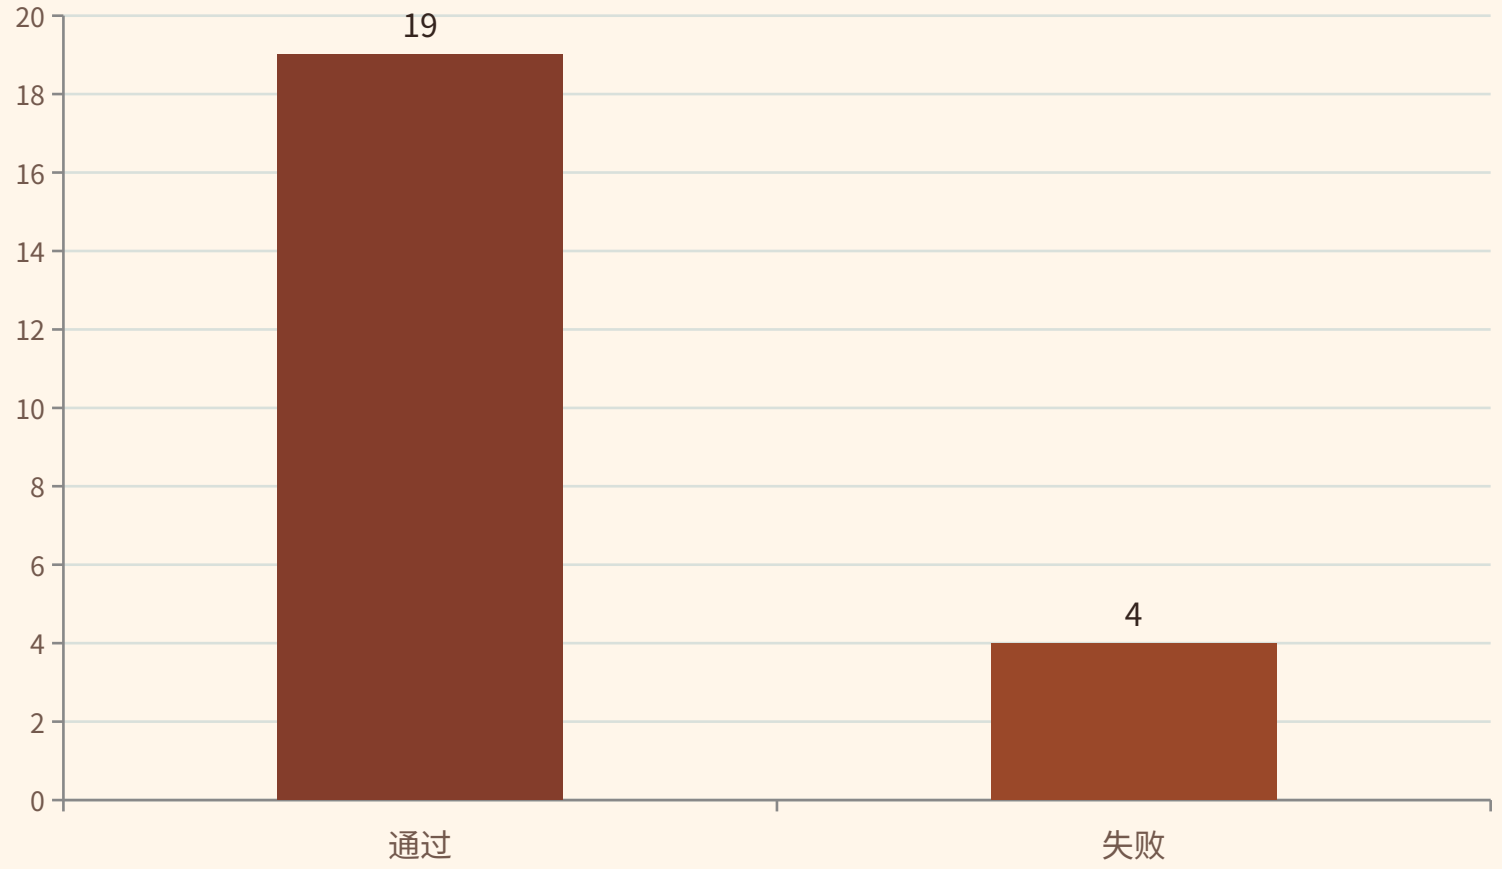

阅读提示

扩展 API 仍有失败，需先判断试点影响

数值来自绑定单元格。
单位、范围及未确认项
请结合来源与讲稿核对。

来源、字段口径与讲稿见随附证据包 · 待人工复核

三种可选路径：建议选择受控试点

【分析】定性分析与建议，不是已测算成本收益。

方案	可获得价值	主要代价或风险	建议判断
维持现状	不新增试跑投入	缺少真实使用反馈	不优先
受控小范围试点	**获得真实复核证据**	**需授权与复核投入**	**有条件推荐**
完善后再试点	先补部分能力缺口	真实反馈仍然缺少	条件不足时采用

试点的价值：把未知变成可核对证据

【建议】待决策；责任、资源与启动条件仍需确认。

01 **用真实授权材料检验决策主线，而非重复合成样本**

02 对照原文核查事实、矛盾、数值和待确认项

03 记录实际模型调用与业务复核投入，不先承诺节省

04 在选定 Office 重开检查文字、图表和表格的可编辑性

成本尚未测算：先明确记录口径和上限

【分析】没有报价、账单或工时记录；不提供虚构金额与节省比例。

成本项	当前证据	试点需记录	批准前确认
模型调用	有用量字段	账单与实际用量	单价及上限待定
人工复核	工时尚无记录	核对及返工工时	人员与工时待定
部署运行	仅有执行时限	耗时与资源消耗	资源上限待定
材料合规	需单次授权	授权与留存边界	资料范围待定

来源、字段口径与讲稿见随附证据包 · 待人工复核

风险要有触发条件和应对动作

【分析】定性判断，非成本收益测算或已批准决定。

风险	触发信号	建议动作
事实误读	引用不支持结论	停止发布并核对原文
字体或编辑异常	目标 Office 重排	装字体并重开验证
规划前运行中断	尚无保存的规划	明确重新授权新建
既存 API 失败	影响试点路径	评审后修复或收窄

按关卡推进，不承诺未经评估的日期

【建议】待决策；责任、资源与启动条件仍需确认。

01

确认边界

授权、责任、资源明确后启动

02

真实试跑

保留用量、来源、导出和告警

03

人工验收

逐页核对并在目标 Office 重开

04

复盘决策

依证据决定停止、补齐或扩围

达标才扩围：导出成功不是唯一门槛

【建议】待决策；责任、资源与启动条件仍需确认。



关键结论和数值逐项回溯；未确认项不写成事实

全页渲染可核对，不忽略阻止发布的质量问题

选定 Office 验证原生编辑，不仅核对截图

已知接口问题、实际投入和资料边界经责任人评审

历史 V2 第 04 页完整截图，仅示范原生稿与栅格的区别

请确认范围、责任、资源与退出条件

【建议】待决策；责任、资源与启动条件仍需确认。

01 是否有条件批准小范围试点（建议：批准）

02 业务复核人与技术负责人（待指定）

03 资料范围、模型留存政策与资源上限（待确认）

04 启动关卡和停止条件；未满足则暂不启动（待确认）
